


MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO — ESFORÇO × IMPACTO

Seleciona quais soluções entram no Plano de Ação — impacto no Y primário versus esforço de implementação

Projeto: Redução do Sobre peso de Envase (Giveaway) na Linha de Biscoitos 02 — baseline 3,4% de sobre peso • meta 1,4% até 11/12/2026 • perda atual 14,3 t/mês (R\$ 117 mil/mês)

Priorização das Soluções Propostas Workshop de soluções de 19/10/2026 • notas de esforço e impacto atribuídas por consenso da equipe (escala 0–10) • orçamento-teto do Charter: R\$ 25 mil

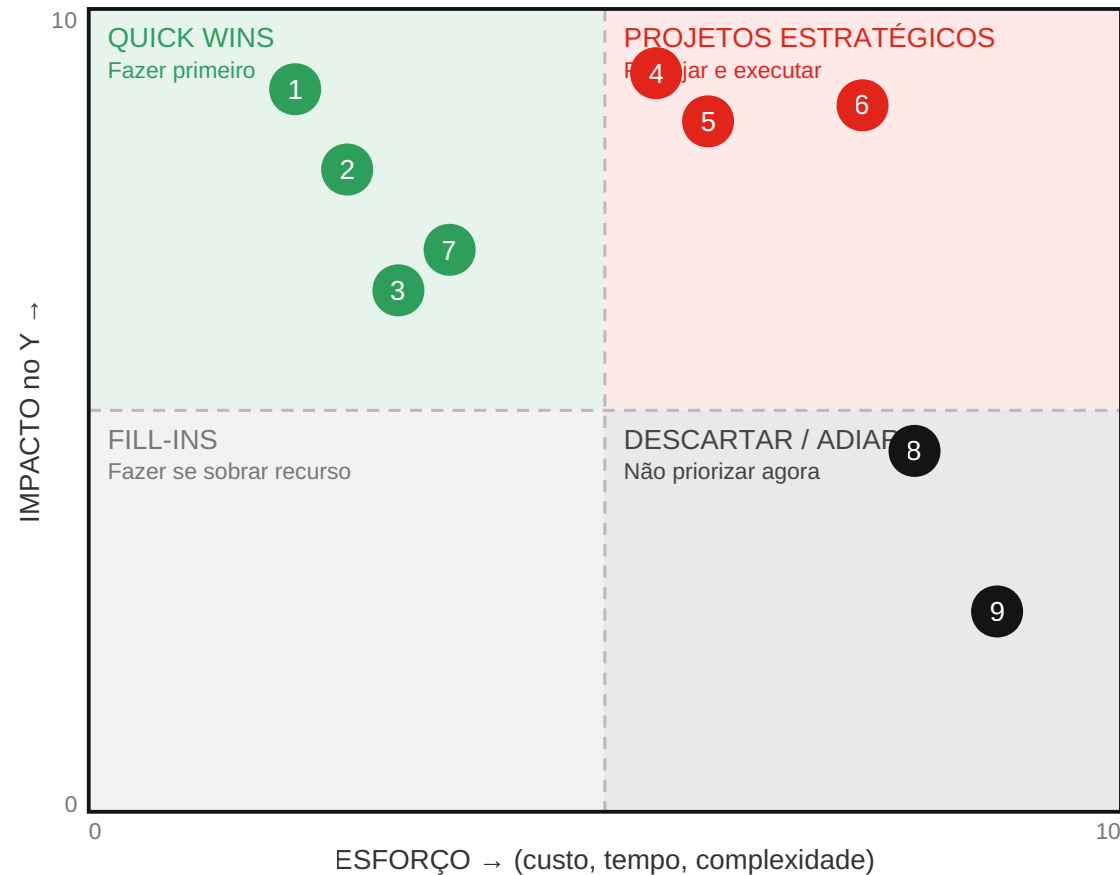

Nº	SOLUÇÃO PROPOSTA	ESF.	IMP.	QUADRANTE
1	Substituir vedações das válvulas dosadoras dos bicos 5–8	2	9	Quick win
2	Incluir troca periódica de vedações no plano de preventiva	2	8	Quick win
3	Padronizar registro de componente/causa nas ordens de manutenção	3	6	Quick win
4	Revisar padrão de setup com ajuste fino por bico (checkweigher)	6	9	Estratégico
5	Definir alvo de peso com margem estatística (DOE de dosagem)	6	9	Estratégico
6	Implantar CEP de variáveis por bico com alarme no checkweigher	8	9	Estratégico
7	Treinar operadores dos 3 turnos no novo padrão de setup	4	7	Quick win
8	Classificar lotes por densidade com ajuste automático de parâmetro	8	4	Descartar
9	Climatizar a sala de envase (controle de temperatura/umidade) com piloto controlado. A solução 8 foi adiada para a fase 2 do programa e a 9 foi descartada (impacto marginal comprovado na estratificação por turno). Todas as priorizadas somam R\$ 15,1 MIL — dentro do orçamento do Charter.	9	2	Descartar
